

Abwasserbeseitigungskonzept
2024-2029 Lüdinghausen

Vorstellung am 30.11.2023



Inhaltsverzeichnis

- 1. Veranlassung und Inhalte des ABK**
- 2. ABK – Vollzug 6. Fortschreibung (2018 bis 2023)**
- 3. ABK – 7. Fortschreibung (2024 bis 2029)**
- 4. Gesamtübersicht der vorgesehenen Maßnahmen und Investitionen**

Veranlassung des ABK


- Die Gemeinden sind gemäß § 47 u. § 53 Landeswassergesetz (LWG) NRW verpflichtet, den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung (**Schmutz- und Niederschlagswasser**) darzustellen und **alle 6 Jahre fortzuschreiben**
- Wie können die **baulichen und hydraulischen Erfordernisse** des Kanalnetzes technisch, wirtschaftlich und zeitnah behoben werden?
- Erstellung eines **ganzheitlichen Konzeptes**, Darstellung der **erforderlichen Maßnahmen**, der **zeitlichen Abfolge** und der **geschätzten Kosten**.

Ziel: Integration aller notwendigen Maßnahmen in das ABK, Ablage der Daten aller Gemeinden in zentraler Datenbank

Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Inhalte des ABK
2. ABK – Vollzug 6. Fortschreibung (2018 bis 2023)
3. ABK – 7. Fortschreibung (2024 bis 2029)
4. Gesamtübersicht der vorgesehenen Maßnahmen und Investitionen

ABK – Vollzug 6. Fortschreibung (2018 bis 2023)

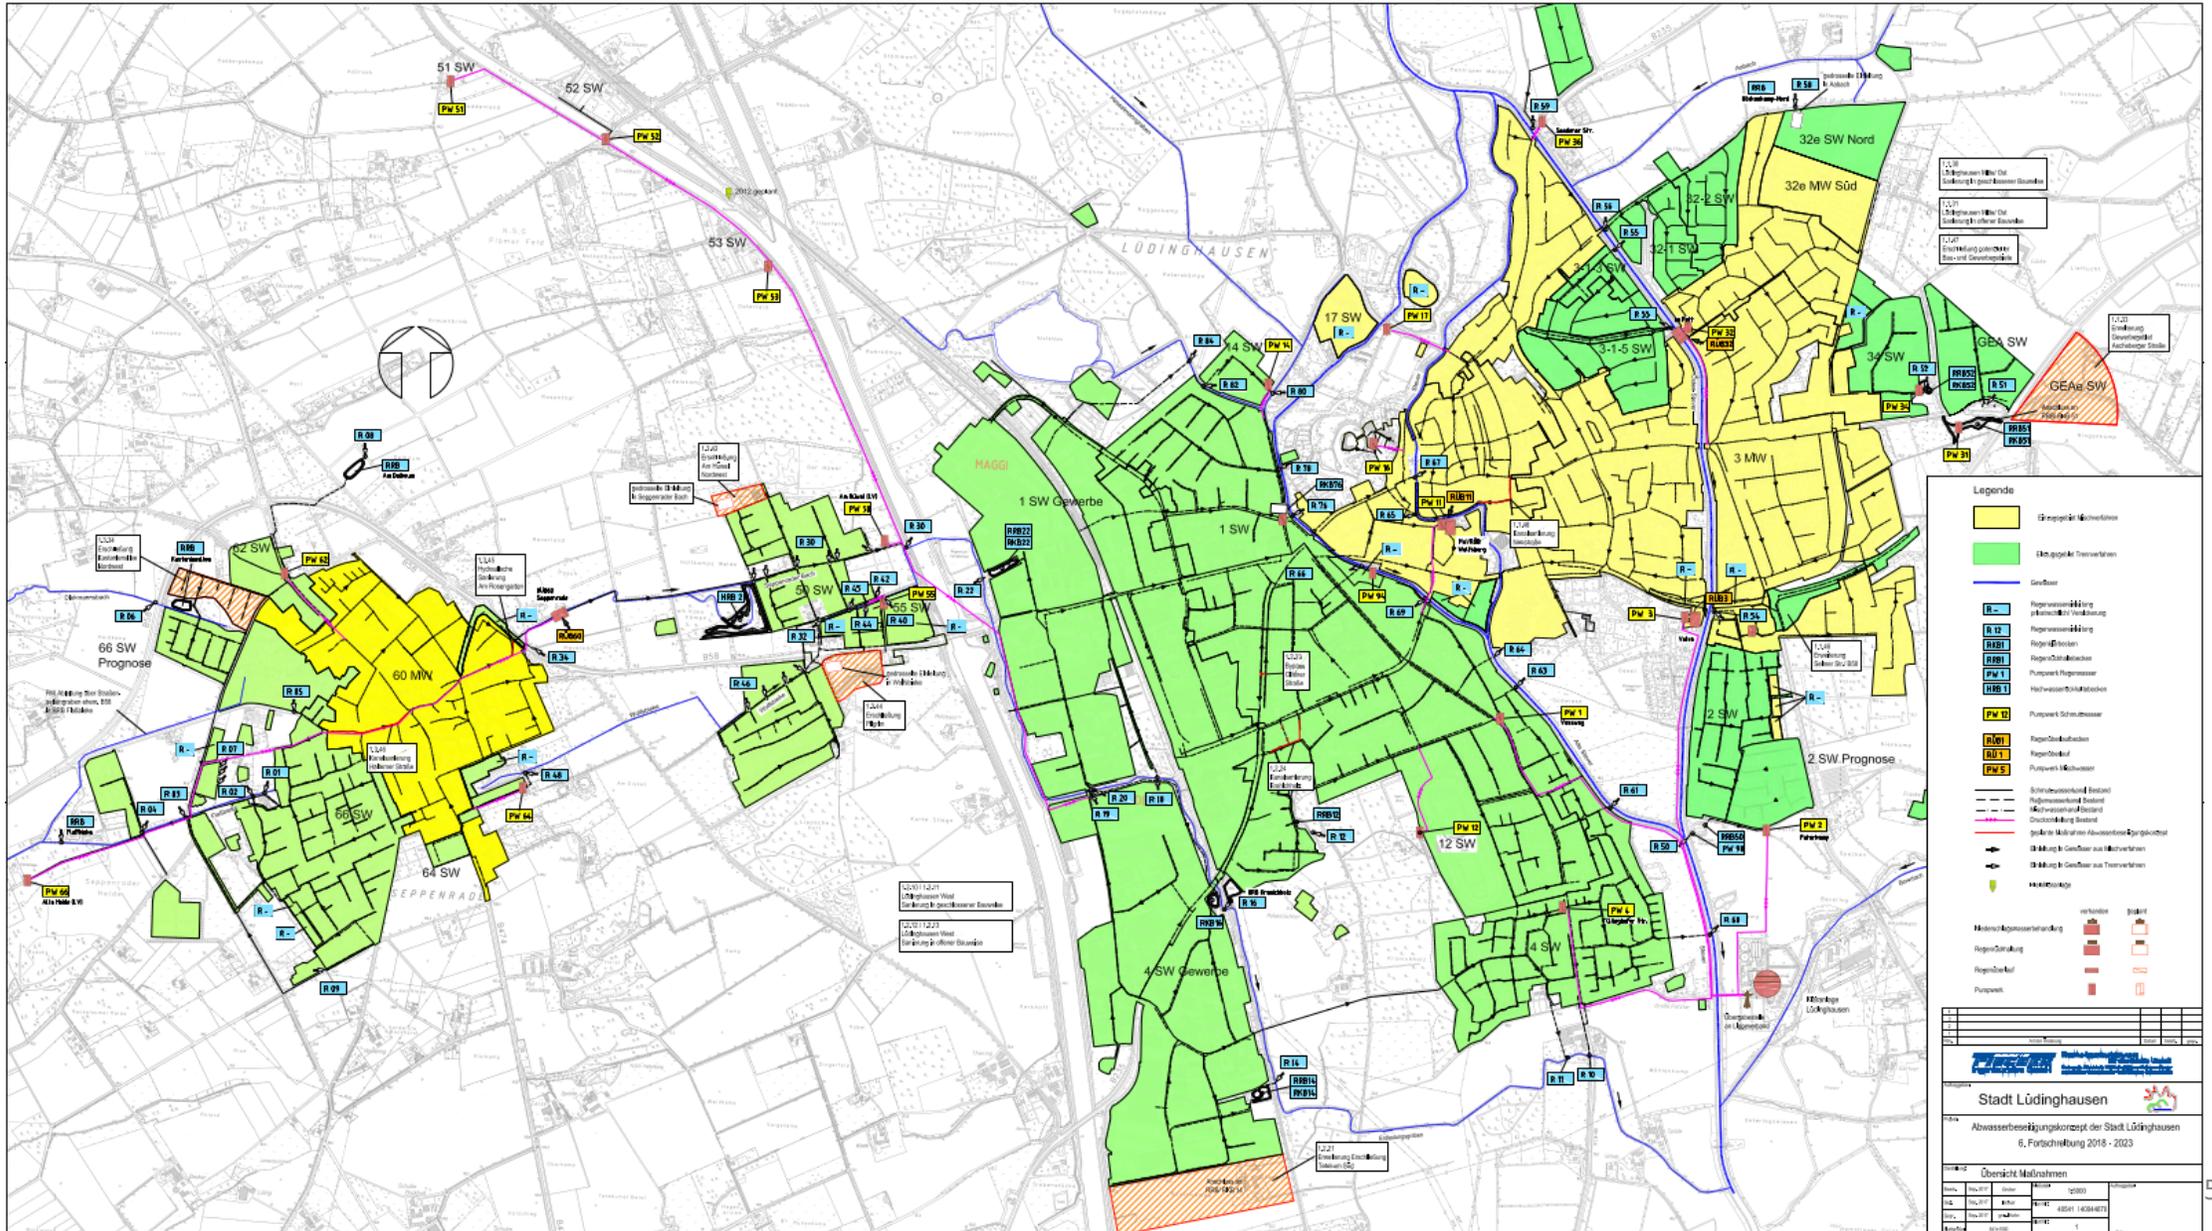

ABK – Vollzug 6. Fortschreibung (2018 bis 2023)

Gemeinde:	Stadt Lüdinghausen												
Teilentwässerungsgebiet:	Lüdinghausen-Mitte/Ost												
							geschätzte Kosten in Euro (brutto)						
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungs-zustand	Baubeginn	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-kosten
1.1.46	Stadt Lüdinghausen	Erweiterung Selmer Straße/B 58	2023	A 1	0	2020	0	0	300.000			0	300.000
1.1.50	Stadt Lüdinghausen	Kanalerneuerung Janackerstiege	2023	A 3	0	2020	0	0	50.000		0	0	50.000
1.1.53	Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Neustraße 1. BA Schwesternheim	2023	A 3	0	2018	300.000	0	0	0	0	0	300.000
1.1.54	Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Neustraße 2. BA	2023	A 3	0	2022	0	0	0	0	0	200.000	200.000
1.3.50	Stadt Lüdinghausen	PW 01 - Vossweg Erneuerung Netzersatzaggregat	2023	A 16	0	2023	0	0	0	0	0	120.000	120.000
1.3.54	Stadt Lüdinghausen	Grundsanierung Grundstücksanschlussleitungen Innenstadt	2023	A 3	0	2022	0	0	0	0	500.000		500.000
1.3.56	Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Sendener Straße	2023	A 3	0	2023	0	0	0	0	0	300.000	300.000
1.3.71	Stadt Lüdinghausen	Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße 1. BA	2023	A 3	0	2023	0	0	0	0	0	550.000	550.000

Gemeinde:	Stadt Lüdinghausen												
Teilentwässerungsgebiet:	Lüdinghausen-West												
							geschätzte Kosten in Euro (brutto)						
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungs-zustand	Baubeginn	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-kosten
1.1.51	Stadt Lüdinghausen	Erschließung Eickholter Busch	2023	A 1	0	2022	0	0	0	0	370.000	0	370.000
1.1.52	Stadt Lüdinghausen	Erschließung Am Hesselmanngraben	2023	A 1	0	2022	0	0	0	0	390.000	0	390.000
1.2.21	Stadt Lüdinghausen	Erweiterung Erschließung Tetekum Süd (Buschkämpe)	2023	A 1	0	2018	550.000		0	0	0	0	550.000
1.2.23	Stadt Lüdinghausen	Bypass Olfener Straße (Verbindung von zwei Regenwasserkanälen)	2023	A 2	0	2018	0	100.000	0	0	0	0	100.000
1.2.25	Stadt Lüdinghausen	Erneuerung NW-Kanalisation Tüllinghofer Straße	2023	A 1	0	2020	0	0	480.000		0	0	480.000
1.2.26	Stadt Lüdinghausen	Kanalisation GE Tetekum-Buschkämpe (2. BA)	2023	A 1	0	2020	0	0	400.000	0	0	0	400.000

Gemeinde:	Stadt Lüdinghausen												
Teilentwässerungsgebiet:	Seppenrade												
							geschätzte Kosten in Euro (brutto)						
Ordnungsnummer	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungs-zustand	Baubeginn	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt-kosten
1.3.34	Stadt Lüdinghausen	Erschließung Kastanienallee Nordwest	2023	A 1	0	2018	355.000		0	0	0	0	355.000
1.3.43	Stadt Lüdinghausen	Erschließung Am Hüwel Nord-West	2023	A 1	0	2020	0	120.000		0	0	0	120.000
1.3.45	Stadt Lüdinghausen	Hydraulische Sanierung Am Rosengarten	2023	A 2	0	2018	345.000	0	0	0	0	0	345.000
1.3.46	Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Halterner Straße	2023	A 3	0	2021	0	0	0	325.000		0	325.000
1.3.47	Stadt Lüdinghausen	Erschließung Leversumer Straße Südwest	2023	A 1	0	2020	0	0	320.000		0	0	320.000
1.3.48	Stadt Lüdinghausen	NW-Kanalisation Ludwig-Uhland-Straße	2023	A 2	0	2020	0	100.000		0	0	0	100.000

Umsetzungszustand: 0 – bereits durchgeführt / 1 – im Bau / 2 – zeitlich verschoben / 3 – nicht mehr erforderl. / 4 – neue Maßnahme

Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Inhalte des ABK
2. ABK – Vollzug 6. Fortschreibung (2018 bis 2023)
3. ABK – 7. Fortschreibung (2024 bis 2029)
4. Gesamtübersicht der vorgesehenen Maßnahmen und Investitionen

ABK – 7. Fortschreibung (2024 bis 2029)

Lüdinghausen Mitte/Ost

Anlage 1: Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2024 bis 2029

Ordnungsnummer	Maßnahme						Kosten in tsd €									
	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichts-jahr	Art der Maßnahme	Umsetzungs-zustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	Gesamt-kosten
1.1.34	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Bauliche Sanierung in geschlossener Bauweise	2023	3	1	fortlaufende Maßnahme	2024	50	50	50	50	50	50	300	300	600
1.1.35	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Bauliche Sanierung in offener Bauweise	2023	3	1	fortlaufende Maßnahme	2024	100	100	100	100	100	100	600	600	1200
1.1.36	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erweiterung Gewerbegebiet Ascheberger Straße Nordost	2023	1	2	Verschieben aufgrund geänderter Prioritäten.	2029	0	0	0	0	0	520	520	0	520
1.1.47	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung potenzieller Bau- und Gewerbegebiete	2023	1	1	fortlaufende Maßnahme	2024	500	500	500	500	500	500	3000	3000	6000
1.1.49	Lippeverband	KA Lüdinghausen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	2023	16	1	fortlaufende Maßnahme	2017	370	100	0	0	0	0	470	0	470
1.2.24	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Straße Kranichholz	2023	3	2	fortlaufende Maßnahme	2024	1150	0	0	0	0	0	1150	0	1150
1.3.44	Investor	Erschließung Pilgrim	2023	1	2	unbestimmte Zeit verschoben	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.51	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Umbau RKB Josefsgraben/Nottengartenweg (Ergänzung Lamellenklärer)	2023	9	4	neu hinzugekommen	2024	300	0	0	0	0	0	300	0	300
1.3.53	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Aabach	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	3677	3677	3677	0	0	11031	0	11031
1.3.57	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Rettungswache Selmer Straße	2023	1	4	neu hinzugekommen	2024	150	0	0	0	0	0	150	0	150
1.3.58	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Leversumer Straße - Nord	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	50	400	0	0	0	0	450	0	450
1.3.59	Investor	Erschließung Schillerstraße	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.60	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Drogeriemarkt Steinbach	2023	1	4	neu hinzugekommen	2024	20	0	0	0	0	0	20	0	20
1.3.61	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erweiterung RKB Julius-Maggi-Str.	2023	9	4	neu hinzugekommen	2025	0	250	0	0	0	0	250	0	250
1.3.62	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Baumschulenweg-Südost	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	50	n. b.	n. b.	0	0	0	50	0	50
1.3.63	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Westrup	2023	1	4	neu hinzugekommen	2026	0	0	50	n. b.	n. b.	0	50	0	50
1.3.64	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung Erweiterungsgebiete Aabach	2023	3	4	neu hinzugekommen	2025	0	276	276	276	0	0	828	0	828
1.3.65	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung Bauerwartungsland Ost	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	1487	1487	0	0	0	2974	0	2974
1.3.66	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	200	0	0	0	0	0	200	0	200
1.3.67	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erneuerung Steuerung u. Pumpentechnik Pumpwerk 02 - Peterkamp	2023	16	4	neu hinzugekommen	2024	60	0	0	0	0	0	60	0	60
1.3.68	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 11 Wolfsberg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	520	0	0	0	0	0	520	0	520
1.3.69	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 1 Vossweg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	640	0	0	0	0	0	640	0	640
1.3.70	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 3 Valve	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	560	0	0	0	0	0	560	0	560
1.3.72	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße 2. BA	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	250	0	0	0	0	0	250	0	250
1.3.73	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Sanierung Druckrohrleitung PW 1 Vossweg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2027	0	0	0	600	0	0	600	0	600
1.3.74	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Sanierung Druckrohrleitung PW 3 Valve	2023	3	4	neu hinzugekommen	2027	0	0	0	410	0	0	410	0	410
1.3.75	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erneuerung PW 4 Tüllinghofer Straße	2023	3	4	neu hinzugekommen	2028	0	0	0	0	1500	0	1500	0	1500
							Summe:	4970	6840	6140	5613	2150	1170			


ABK – 7. Fortschreibung (2024 bis 2029)

Lüdinghausen West

Anlage 1: Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2024 bis 2029

Ordnungsnummer	Maßnahme						Kosten in tsd €									
	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichts-jahr	Art der Maßnahme	Umsetzungs-zustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	Gesamt-kosten
1.1.34	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Bauliche Sanierung in geschlossener Bauweise	2023	3	1	fortlaufende Maßnahme	2024	50	50	50	50	50	50	300	300	600
1.1.35	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Bauliche Sanierung in offener Bauweise	2023	3	1	fortlaufende Maßnahme	2024	100	100	100	100	100	100	600	600	1200
1.1.36	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erweiterung Gewerbegebiet Ascheberger Straße Nordost	2023	1	2	Verschieben aufgrund geänderter Prioritäten.	2029	0	0	0	0	0	520	520	0	520
1.1.47	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung potenzieller Bau- und Gewerbegebiete	2023	1	1	fortlaufende Maßnahme	2024	500	500	500	500	500	500	3000	3000	6000
1.1.49	Lippeverband	KA Lüdinghausen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	2023	16	1	fortlaufende Maßnahme	2017	370	100	0	0	0	0	470	0	470
1.2.24	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Straße Kranichholz	2023	3	2	fortlaufende Maßnahme	2024	1150	0	0	0	0	0	1150	0	1150
1.3.44	Investor	Erschließung Pilgrim	2023	1	2	unbestimmte Zeit verschoben	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.51	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Umbau RKB Josefsgraben/Nottengartenweg (Ergänzung Lamellenklärer)	2023	9	4	neu hinzugekommen	2024	300	0	0	0	0	0	300	0	300
1.3.53	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Aabach	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	3677	3677	3677	0	0	11031	0	11031
1.3.57	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Rettungswache Selmer Straße	2023	1	4	neu hinzugekommen	2024	150	0	0	0	0	0	150	0	150
1.3.58	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Leversumer Straße - Nord	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	50	400	0	0	0	0	450	0	450
1.3.59	Investor	Erschließung Schillerstraße	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.60	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Drogeriemarkt Steinbach	2023	1	4	neu hinzugekommen	2024	20	0	0	0	0	0	20	0	20
1.3.61	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erweiterung RKB Julius-Maggi-Str.	2023	9	4	neu hinzugekommen	2025	0	250	0	0	0	0	250	0	250
1.3.62	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Baumschulenweg-Südost	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	50	n. b.	n. b.	0	0	0	50	0	50
1.3.63	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Westrup	2023	1	4	neu hinzugekommen	2026	0	0	50	n. b.	n. b.	0	50	0	50
1.3.64	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung Erweiterungsgebiete Aabach	2023	3	4	neu hinzugekommen	2025	0	276	276	276	0	0	828	0	828
1.3.65	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung Bauerwartungsland Ost	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	1487	1487	0	0	0	2974	0	2974
1.3.66	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	200	0	0	0	0	0	200	0	200
1.3.67	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erneuerung Steuerung u. Pumpentechnik Pumpwerk 02 - Paterkamp	2023	16	4	neu hinzugekommen	2024	60	0	0	0	0	0	60	0	60
1.3.68	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 11 Wolfsberg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	520	0	0	0	0	0	520	0	520
1.3.69	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 1 Vossweg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	640	0	0	0	0	0	640	0	640
1.3.70	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 3 Valve	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	560	0	0	0	0	0	560	0	560
1.3.72	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße 2. BA	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	250	0	0	0	0	0	250	0	250
1.3.73	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Sanierung Druckrohrleitung PW 1 Vossweg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2027	0	0	0	600	0	0	600	0	600
1.3.74	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Sanierung Druckrohrleitung PW 3 Valve	2023	3	4	neu hinzugekommen	2027	0	0	0	410	0	0	410	0	410
1.3.75	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erneuerung PW 4 Tüllinghofer Straße	2023	3	4	neu hinzugekommen	2028	0	0	0	0	1500	0	1500	0	1500
Summe:								4970	6840	6140	5613	2150	1170			

ABK – 7. Fortschreibung (2024 bis 2029)

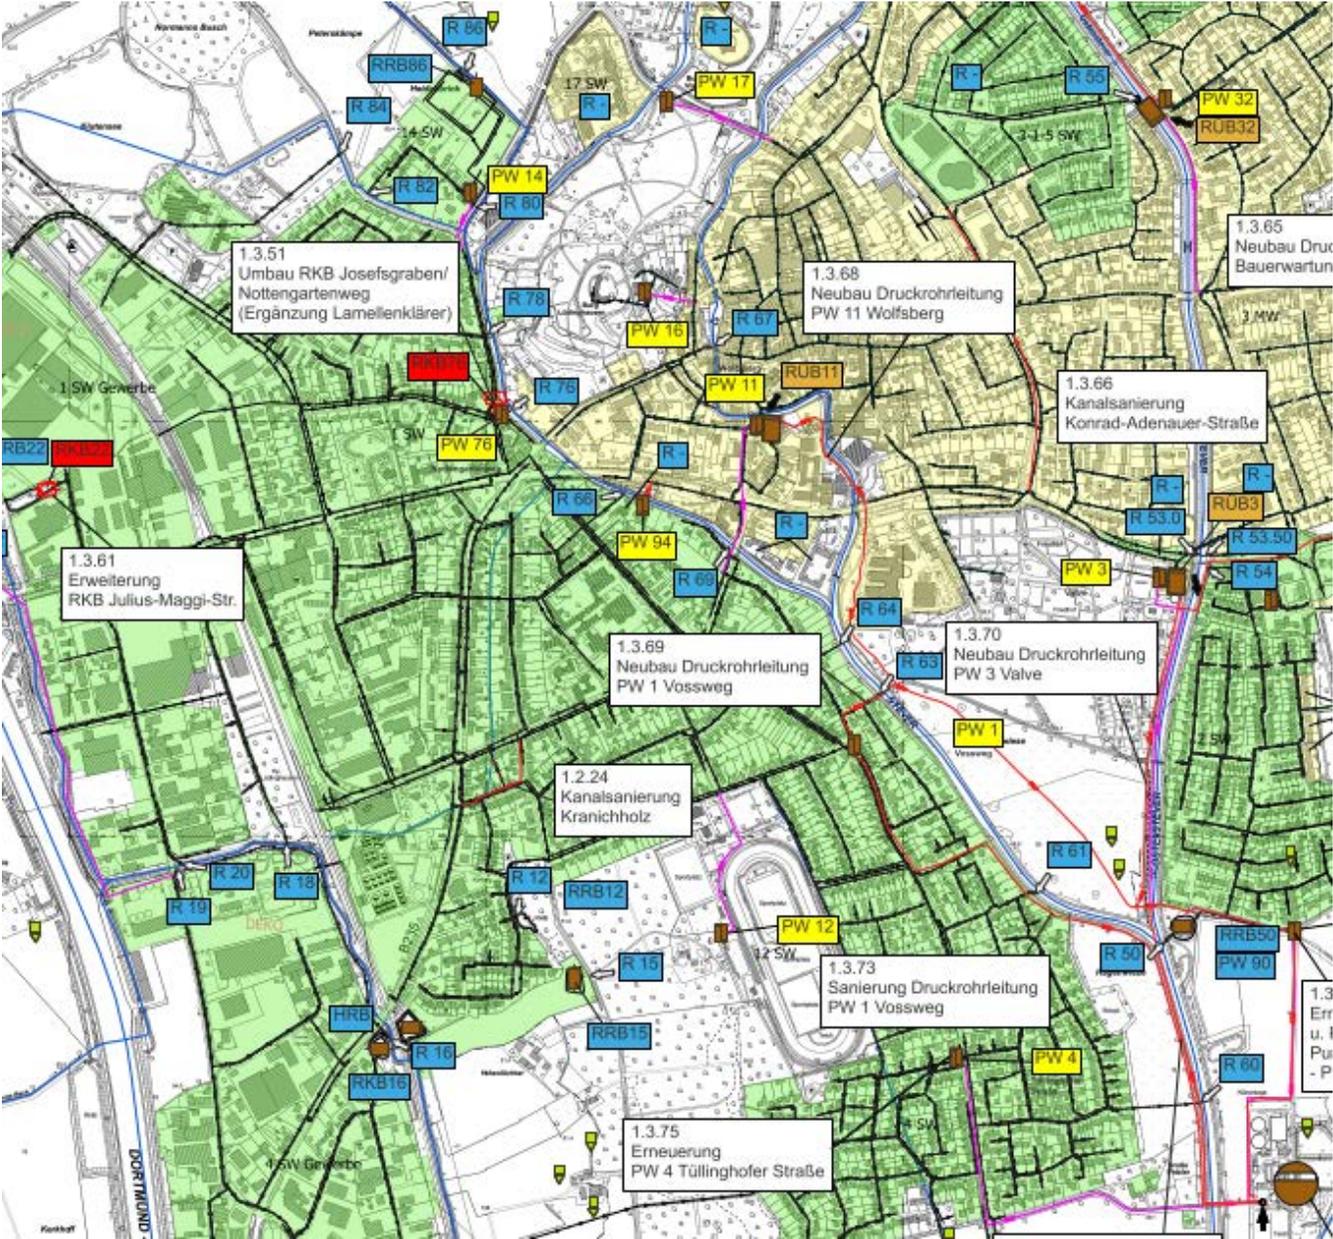


ABK – 7. Fortschreibung (2024 bis 2029)

Lüdinghausen Seppenrade

Anlage 1: Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2024 bis 2029

Ordnungsnummer	Maßnahme						Kosten in tsd €									
	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichtsjahr	Art der Maßnahme	Umsetzungszustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	Gesamtkosten
1.1.34	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Bauliche Sanierung in geschlossener Bauweise	2023	3	1	fortlaufende Maßnahme	2024	50	50	50	50	50	50	300	300	600
1.1.35	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Bauliche Sanierung in offener Bauweise	2023	3	1	fortlaufende Maßnahme	2024	100	100	100	100	100	100	600	600	1200
1.1.36	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erweiterung Gewerbegebiet Ascheberger Straße Nordost	2023	1	2	Verschieben aufgrund geänderter Prioritäten.	2029	0	0	0	0	0	520	520	0	520
1.1.47	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung potenzieller Bau- und Gewerbegebiete	2023	1	1	fortlaufende Maßnahme	2024	500	500	500	500	500	500	3000	3000	6000
1.1.49	Lippeverband	KA Lüdinghausen - Maßnahmen ohne Beeinflussung der Ablaufqualität	2023	16	1	fortlaufende Maßnahme	2017	370	100	0	0	0	0	470	0	470
1.2.24	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Straße Kranichholz	2023	3	2	fortlaufende Maßnahme	2024	1150	0	0	0	0	0	1150	0	1150
1.3.44	Investor	Erschließung Pilgrim	2023	1	2	Maßnahme auf unbestimmte Zeit verschoben	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.51	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Umbau RKB Josefsgraben/Nottengartenweg (Ergänzung Lamellenklärer)	2023	9	4	neu hinzugekommen	2024	300	0	0	0	0	0	300	0	300
1.3.53	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Aabach	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	3677	3677	3677	0	0	11031	0	11031
1.3.57	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Rettungswache Selmer Straße	2023	1	4	neu hinzugekommen	2024	150	0	0	0	0	0	150	0	150
1.3.58	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Leversumer Straße - Nord	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	50	400	0	0	0	0	450	0	450
1.3.59	Investor	Erschließung Schillerstraße	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.60	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Drogeriemarkt Steinbach	2023	1	4	neu hinzugekommen	2024	20	0	0	0	0	0	20	0	20
1.3.61	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erweiterung RKB Julius-Maggi-Str.	2023	9	4	neu hinzugekommen	2025	0	250	0	0	0	0	250	0	250
1.3.62	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Baumschulenweg-Südost	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	50	n. b.	n. b.	0	0	0	50	0	50
1.3.63	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Westrup	2023	1	4	neu hinzugekommen	2026	0	0	50	n. b.	n. b.	0	50	0	50
1.3.64	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung Erweiterungsgebiete Aabach	2023	3	4	neu hinzugekommen	2025	0	276	276	276	0	0	828	0	828
1.3.65	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung Bauerwartungsland Ost	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	1487	1487	0	0	0	2974	0	2974
1.3.66	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	200	0	0	0	0	0	200	0	200
1.3.67	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erneuerung Steuerung u. Pumpentechnik Pumpwerk 02 - Paterkamp	2023	16	4	neu hinzugekommen	2024	60	0	0	0	0	0	60	0	60
1.3.68	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 11 Wolfsberg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	520	0	0	0	0	0	520	0	520
1.3.69	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 1 Vossweg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	640	0	0	0	0	0	640	0	640
1.3.70	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 3 Valve	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	560	0	0	0	0	0	560	0	560
1.3.72	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße 2. BA	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	250	0	0	0	0	0	250	0	250
1.3.73	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Sanierung Druckrohrleitung PW 1 Vossweg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2027	0	0	0	600	0	0	600	0	600
1.3.74	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Sanierung Druckrohrleitung PW 3 Valve	2023	3	4	neu hinzugekommen	2027	0	0	0	410	0	0	410	0	410
1.3.75	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erneuerung PW 4 Tüllinghofer Straße	2023	3	4	neu hinzugekommen	2028	0	0	0	0	1500	0	1500	0	1500
Summe:								4970	6840	6140	5613	2150	1170			

ABK – 7. Fortschreibung (2024 bis 2029)

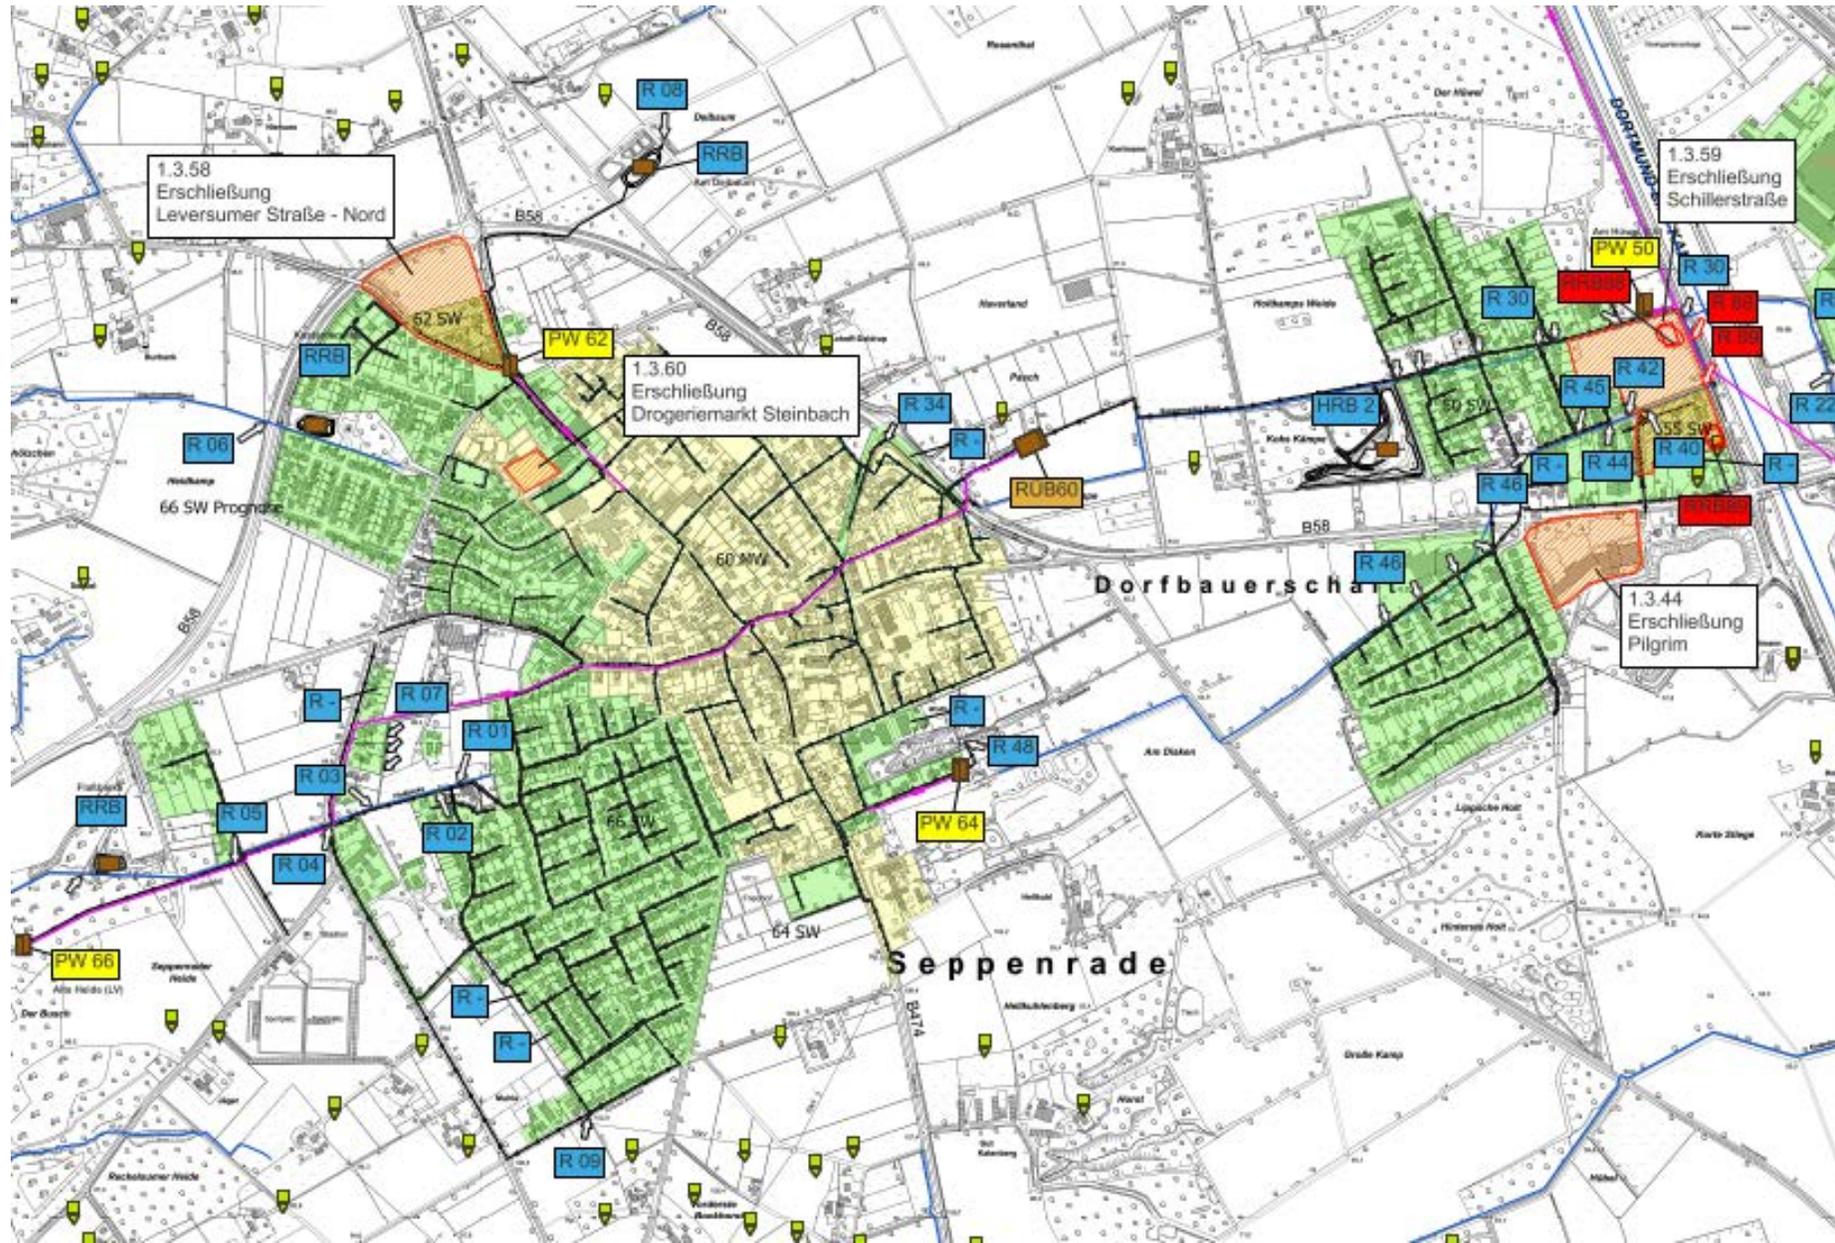

Inhaltsverzeichnis

1. Veranlassung und Inhalte des ABK
2. ABK – Vollzug 6. Fortschreibung (2018 bis 2023)
3. ABK – 7. Fortschreibung (2024 bis 2029)
4. Gesamtübersicht der vorgesehenen Maßnahmen und Investitionen

Gesamtübersicht der vorgesehenen Maßnahmen und Investitionen

Anlage 1: Gesamtzusammenstellung der geplanten Maßnahmen im Zeitraum 2024 bis 2029

Ordnungsnummer	Maßnahme						Kosten in tsd €									
	Träger der Maßnahme	Bezeichnung	Berichts-jahr	Art der Maßnahme	Umsetzungs-zustand	Umsetzungszustand Bemerkung	Baubeginn	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kosten Planungszeitraum	Kosten Folgezeitraum	
1.1.34	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Bauliche Sanierung in geschlossener Bauweise	2023	3	1	fortlaufende Maßnahme	2024	50	50	50	50	50	50	300	300	
1.1.35	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Bauliche Sanierung in offener Bauweise	2023	3	1	fortlaufende Maßnahme	2024	100	100	100	100	100	100	600	600	
1.1.36	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erweiterung Gewerbegebiet Ascheberger Straße Nordost	2023	1	2	Verschieben aufgrund geänderter Prioritäten.	2029	0	0	0	0	0	520	520	0	
1.1.47	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung potenzieller Bau- und Gewerbegebiete KA Lüdinghausen - Maßnahmen ohne	2023	1	1	fortlaufende Maßnahme	2024	500	500	500	500	500	500	3000	3000	
1.1.49	Lippeverband	Beeinflussung der Ablaufqualität	2023	16	1	fortlaufende Maßnahme	2017	370	100	0	0	0	0	470	0	
1.2.24	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Straße Kranichholz	2023	3	2	fortlaufende Maßnahme	2024	1150	0	0	0	0	0	1150	0	
1.3.44	Investor	Erschließung Pilgrim	2023	1	2	unbestimmte Zeit verschoben	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.51	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Umbau RKB Josefsgraben/Nottengartenweg (Ergänzung Lamellenklärer)	2023	9	4	neu hinzugekommen	2024	300	0	0	0	0	0	300	0	
1.3.53	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Aabach	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	3677	3677	3677	0	0	11031	0	
1.3.57	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Rettungswache Selmer Straße	2023	1	4	neu hinzugekommen	2024	150	0	0	0	0	0	150	0	
1.3.58	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Leversumer Straße - Nord	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	50	400	0	0	0	0	450	0	
1.3.59	Investor	Erschließung Schillerstraße	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.60	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Drogeriemarkt Steinbach	2023	1	4	neu hinzugekommen	2024	20	0	0	0	0	0	20	0	
1.3.61	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erweiterung RKB Julius-Maggi-Str.	2023	9	4	neu hinzugekommen	2025	0	250	0	0	0	0	250	0	
1.3.62	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Baumschulenweg-Südost	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	50	n. b.	n. b.	0	0	0	50	0	
1.3.63	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erschließung Westrup	2023	1	4	neu hinzugekommen	2026	0	0	50	n. b.	n. b.	0	50	0	
1.3.64	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung Erweiterungsgebiete Aabach	2023	3	4	neu hinzugekommen	2025	0	276	276	276	0	0	828	0	
1.3.65	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung Bauerwartungsland Ost	2023	1	4	neu hinzugekommen	2025	0	1487	1487	0	0	0	2974	0	
1.3.66	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Kanalsanierung Konrad-Adenauer-Straße	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	200	0	0	0	0	0	200	0	
1.3.67	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erneuerung Steuerung u. Pumpentechnik Pumpwerk 02 - Paterkamp	2023	16	4	neu hinzugekommen	2024	60	0	0	0	0	0	60	0	
1.3.68	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 11 Wolfsberg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	520	0	0	0	0	0	520	0	
1.3.69	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 1 Vossweg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	640	0	0	0	0	0	640	0	
1.3.70	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Neubau Druckrohrleitung PW 3 Valve	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	560	0	0	0	0	0	560	0	
1.3.72	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Grundstücksanschlussleitungen Stadtfeldstraße 2. BA	2023	3	4	neu hinzugekommen	2024	250	0	0	0	0	0	250	0	
1.3.73	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Sanierung Druckrohrleitung PW 1 Vossweg	2023	3	4	neu hinzugekommen	2027	0	0	0	600	0	0	600	0	
1.3.74	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Sanierung Druckrohrleitung PW 3 Valve	2023	3	4	neu hinzugekommen	2027	0	0	0	410	0	0	410	0	
1.3.75	Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen	Erneuerung PW 4 Tüllinghofer Straße	2023	3	4	neu hinzugekommen	2028	0	0	0	0	1500	0	1500	0	
Summe:								4970	6840	6140	5613	2150	1170			



Herzlichen Dank!

